

神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部 主塔(2P)基礎工事

2026年7月号

神戸をつなぐ、世界とつながる。
大阪湾岸道路西伸部

■工事概要

工事名：神戸港臨港道路
大阪湾岸道路西伸部主塔(2P)基礎工事


施工場所：神戸市灘区摩耶埠頭地先(摩耶埠頭沖)

施工会社：五洋・若築・大本特定建設工事共同企業体

工期：2026年12月～2030年3月

主な工種：基礎工(鋼管矢板、鋼管杭打設 約250本、鋼管内掘削、継手処理、支保工、基礎内掘削)、構造物撤去工、附帯工、計測管理工

■施工平面図(2026年6月末現在)

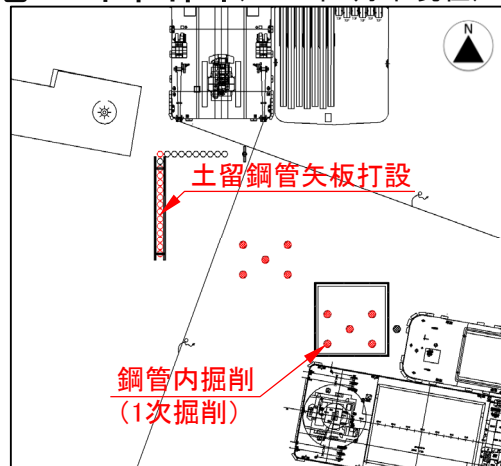

■工事施工フロー (凡例 白地:今後の施工、赤地:施工中 灰地:施工完了)



■6月の施工記録・トピックス



土留鋼管矢板の打設

鋼管矢板井筒基礎の施工に先立ち、近接する防波堤を保護するために土留鋼管矢板を打設



工場で強度を確認した材料を搬入しています。



土砂・石材の撤去

今後の施工で支障となる土砂・石材を撤去



引張試験

鋼管の一部をアムスラー試験機で引張試験し、強度を確認



試験片

■お知らせ

- ・7月下旬に鋼管杭・鋼管矢板打設用の大型杭打ち船(1800t吊)が神戸港に入域
- ・8月上旬から全長70mの鋼管杭打設に着手
